V4 TECNOLOGIA BRASIL · DIGITALGOV

V4 FÁBRICAGOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

Relatório Técnico de Execução e Medição — novembro de 2026

Tecnologias, UST, código e telas

Órgão	[EXISTE — nome e documentos a enviar pelo responsável]
Contrato	FIC-COM-2026-001
Período / referência	novembro de 2026
Gerado em	2026-11-06 16:56
Classificação	Documento para o órgão

Documento gerado a partir de registros verificáveis (git, testes, evidências e registros humanos). Itens sem registro aparecem como "sem registro".

DOCUMENTO V4 TECNOLOGIA BRASIL

V4 FÁBRICA GOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

1. Situação do contrato

O ciclo é: **a empresa executa → o órgão confere e aceita → o órgão paga**. Cada etapa só avança quando a anterior tem registro.

Etapa	UST	Valor	Situação
Contratado	12.000	—	total do contrato
Executado	202,5	R$ 6.075,00	entregue, testado e auditado; vai para o aceite do órgão
Aceito pelo órgão	0	—	próxima etapa: o órgão confere o executado e emite o termo de aceite
Pago	0	—	depois do aceite (registre em PAGAMENTOS.csv)
Saldo para executar	**11.797,5**		contratado − executado
↳ já planejado	0		0 módulo(s) com data (seção 11)
↳ ainda sem planejamento	11.797,5		precisa de novas demandas/OS do órgão

Em uma frase: de 12.000 UST contratadas, 202,5 já foram executadas (1,7%); 0 estão planejadas e 11.797,5 ainda não têm demanda.

> *OS-FIC-002: Catálogo PROPOSTO-V1 aprovado pela contratada em 06/11/2026 (R$ 30,00 por UST), pendente de ratificação pelo órgão. A medição parcial (cada módulo dividido pelos itens de escopo do TR) é proposta da contratada e depende de confirmação. Sem OS assinada pelo órgão, nenhuma quantidade é considerada aceita.*

2. Meta diária

- **Meta de hoje (06/11/2026):** 0 UST — nenhum módulo planejado para hoje.
- **Executado hoje:** 202,5 UST.

Como a meta é calculada: a UST de cada módulo do planejamento é dividida igualmente pelos dias úteis entre a data de início e a de fim; a meta do dia é a soma dos módulos em andamento naquele dia. O executado entra no dia em que o módulo foi medido.

Dia	Meta (UST)	Executado (UST)	Meta acumulada	Executado acumulado
06/11 (hoje)	0	202,5	0	202,5

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

V4 FÁBRICAGOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

3. Identificação

Campo	Informação
Órgão	[EXISTE — nome e documentos a enviar pelo responsável]
Contrato	FIC-COM-2026-001
Objeto	Plataforma Integrada de Comunicação Institucional e Atendimento Digital
Ordens de serviço	OS-FIC-002 — Correção e endurecimento da base (12 achados do diagnóstico)
Sistema(s)	contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio
Período	novembro de 2026 (até 06/11/2026)
Contratada	V4 Tecnologia Brasil · DigitalGov — CNPJ 24.361.188/0001-61
Responsável técnico	Warley Luciano Costa Gomes

4. Equipe técnica e agentes de IA

Os agentes de IA executam as etapas técnicas; a equipe técnica responde por eles: orienta, revisa e aprova. Participação individual só aparece quando há registro (commit, revisão, ata ou registro do gestor).

Nome	Função	Responsabilidade	Desde	Participações registradas
Jerlian	Programador	—	—	nenhuma ainda
Ruan	Programador	—	—	nenhuma ainda
Arthur Miguel	Programador	—	—	nenhuma ainda
Warley	Programador	—	—	nenhuma ainda
Werverton	Programador	—	—	nenhuma ainda
João Miguel	Programador	—	—	nenhuma ainda
Warley C.	Programador	—	—	nenhuma ainda

Etapas da OS-FIC-002 executadas pelos agentes:

Etapa	Agente (papel na fábrica)	Resultado	Data	Situação
Código (banco, API, telas, testes)	G06/G07/G08 + gerador de cadastros	commits no git (autor: Claude)	2026-11-06	concluído

Etapa	Agente (papel na fábrica)	Resultado	Data	Situação
Conferência da autorização	G03 Gestor Contratual	autorização registrada	2026-11-06	concluído
Execução dos testes	G12 Engenheiro de Testes	97 verificações aprovadas	2026-11-06	concluído
Registro dos commits	G17 Auditor de Evidências	13 commits	2026-11-06	concluído
Auditoria das evidências	G17 Auditor de Evidências	4 módulos aprovados	2026-11-06	concluído
Medição	G15 Medidor de UST	previsto 202.5 · comprovado 202.5 · aceito 0	2026-11-06	concluído
Relatórios	G19 Gerador de Relatórios	relatório diário e fechamento gerados	2026-11-06	concluído
Checklist de qualidade	G20 Homologador Técnico	18 controle(s) crítico(s) aguardam verificação humana — verifique e rode de novo com --aprovado-por "Nome (cargo)"	2026-11-06	aguardando a equipe
Pacote de entrega	G20 Homologador Técnico	—	—	pendente


5. O que foi feito e quanto foi medido

Módulo	O que foi entregue	Item do contrato	UST executada	Testes
MOD-001 — Controle de sessão (TR M01, item 2 de 4)	Banco de dados, Testes automatizados	CAT-M01-02	202,5	37 ok, 0 falha(s)
MOD-002 — Correções de validação e privacidade (M03, M05, M07, M08)	Banco de dados, Testes automatizados	CORRETIVA-SEM-ITEM	0	36 ok, 0 falha(s)
MOD-003 — Base técnica — migrações versionadas, cabeçalhos de segurança, dependências	Infraestrutura, Banco de dados, Testes automatizados	CORRETIVA-SEM-ITEM	0	12 ok, 0 falha(s)
MOD-004 — Painel da fábrica — chave de acesso (ferramenta interna)	Testes automatizados	INTERNO-FABRICA	0	12 ok, 0 falha(s)
Total			**202,5**	

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL


MOD-001 — Controle de sessão (TR M01, item 2 de 4)

- **Banco de dados:** estrutura e acesso a dados — 2 arquivo(s), 8 linhas.
- **Testes:** 37 executado(s), 0 falha(s) — APROVADO em 2026-11-06 (1 arquivo(s) de teste, 68 linhas).
- **Medição:** item CAT-M01-02 — M01 entrega 2 de 4: Controle de sessão: previsto 202,5, executado **202,5**, aceito 0 UST.
- **Commits:** `102fc9f` 2026-11-06 MOD-003: código da plataforma de comunicação organizado por camada e módulo; `532d886` 2026-11-06 MOD-001 MOD-002 MOD-003: sessão revogável, validações, privacidade e migrações (OS-FIC-002); `f823f56` 2026-11-06 fabrica: diagnóstico do pacote DIGITALGOV (contrato fictício FIC-COM-2026-001).
- **Responsável:** equipe técnica (Jerlian, Ruan, Arthur Miguel, Warley, Werverton, João Miguel, Warley C.); revisão individual deste módulo: sem registro.

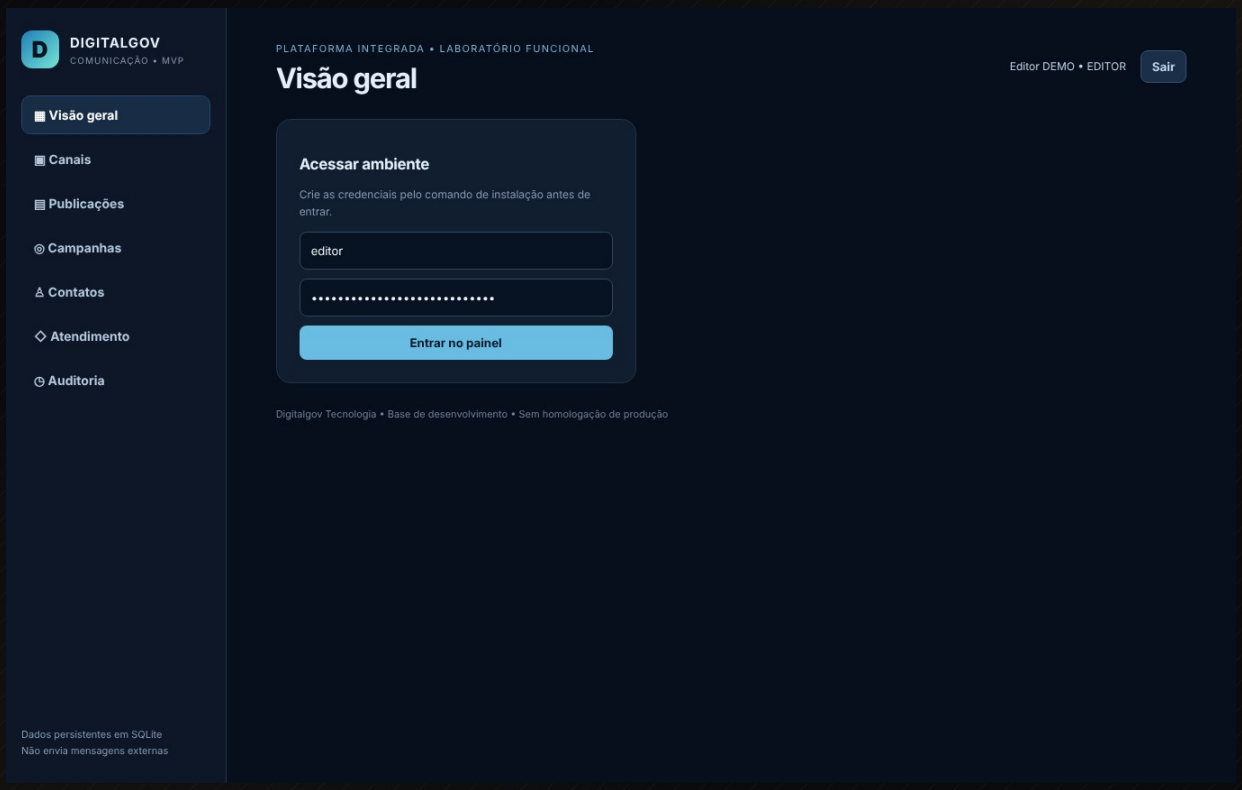

MOD-001 — 001_01_apos_sair (preview)

V4 FÁBRICA GOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

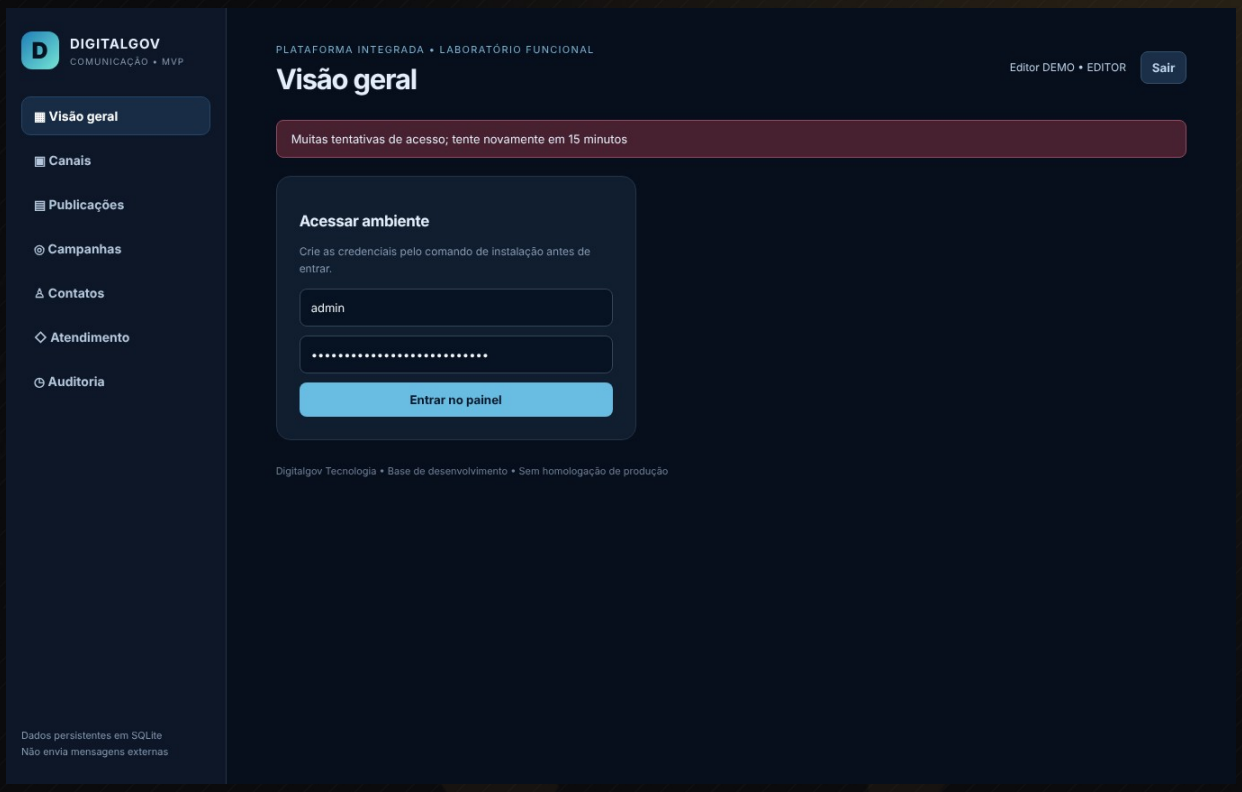


MOD-001 — 001_02_bloqueio_tentativas (preview)

MOD-002 — Correções de validação e privacidade (M03, M05, M07, M08)

- **Banco de dados:** estrutura e acesso a dados — 2 arquivo(s), 9 linhas.
- **Testes:** 36 executado(s), 0 falha(s) — APROVADO em 2026-11-06 (1 arquivo(s) de teste, 74 linhas).
- **Medição:** item CORRETIVA-SEM-ITEM — Correção de defeito em código preexistente — sem item no catálogo: previsto 0, executado **0**, aceito 0 UST.
- **Commits:** `102fc9f` 2026-11-06 MOD-003: código da plataforma de comunicação organizado por camada e módulo; `532d886` 2026-11-06 MOD-001 MOD-002 MOD-003: sessão revogável, validações, privacidade e migrações (OS-FIC-002); `f823f56` 2026-11-06 fabrica: diagnóstico do pacote DIGITALGOV (contrato fictício FIC-COM-2026-001).
- **Responsável:** equipe técnica (Jerlian, Ruan, Arthur Miguel, Warley, Werverton, João Miguel, Warley C.); revisão individual deste módulo: sem registro.


V4 FÁBRICA GOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG
V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

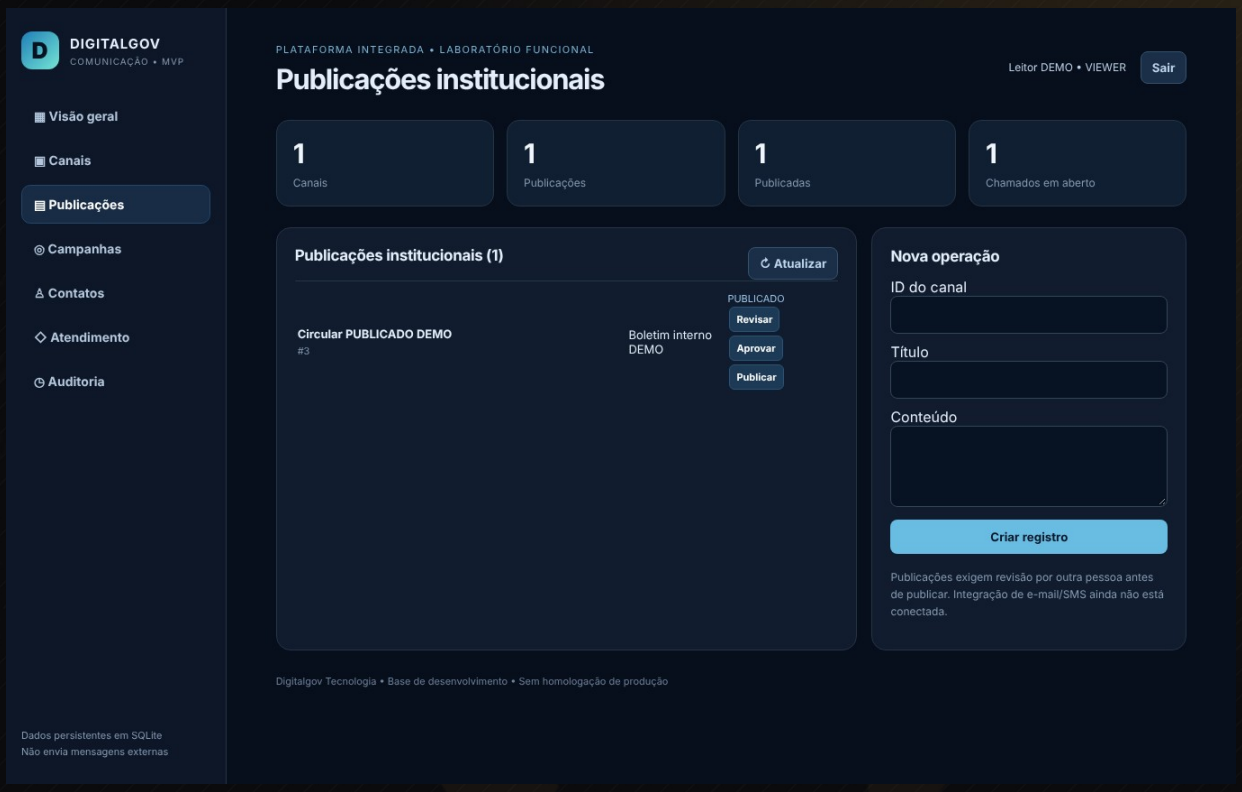

MOD-002 — 002_01_leitor_so_publicadas (preview)

V4 FÁBRICA GOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO

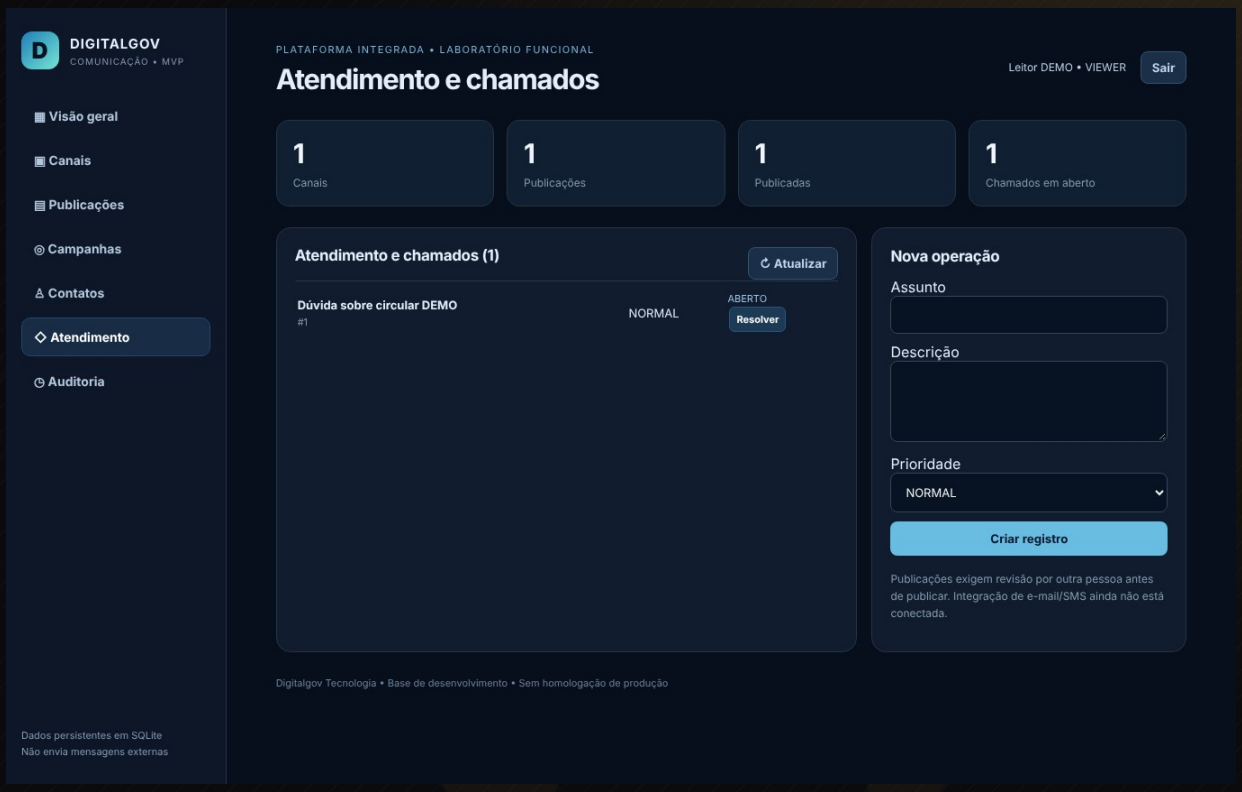

MOD-002 — 002_02_leitor_chamados (preview)


MOD-003 — Base técnica — migrações versionadas, cabeçalhos de segurança, dependências

- **Banco de dados:** estrutura e acesso a dados — 3 arquivo(s), 40 linhas.
- **Infraestrutura:** 8 arquivo(s), 234 linhas.
- **Testes:** 12 executado(s), 0 falha(s) — APROVADO em 2026-11-06 (3 arquivo(s) de teste, 165 linhas).
- **Medição:** item CORRETIVA-SEM-ITEM — Correção de defeito em código preexistente — sem item no catálogo: previsto 0, executado **0**, aceito 0 UST.
- **Commits:** `91613ad` 2026-11-06 MOD-003: implantação, backup, manuais e CI da plataforma de comunicação; `102fc9f` 2026-11-06 MOD-003: código da plataforma de comunicação organizado por camada e módulo; `532d886` 2026-11-06 MOD-001 MOD-002 MOD-003: sessão revogável, validações, privacidade e migrações (OS-FIC-002); `f823f56` 2026-11-06 fabrica: diagnóstico do pacote DIGITALGOV (contrato fictício FIC-COM-2026-001).
- **Responsável:** equipe técnica (Jerlian, Ruan, Arthur Miguel, Warley, Werverton, João Miguel, Warley C.); revisão individual deste módulo: sem registro.

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL


MOD-004 — Painel da fábrica — chave de acesso (ferramenta interna)

- **Testes:** 12 executado(s), 0 falha(s) — APROVADO em 2026-11-06 (3 arquivo(s) de teste, 130 linhas).
- **Medição:** item INTERNO-FABRICA — Ferramenta interna da contratada (painel da fábrica) — não é entregável do contrato: previsto 0, executado **0**, aceito 0 UST.
- **Commits:** `91613ad` 2026-11-06 MOD-003: implantação, backup, manuais e CI da plataforma de comunicação; `de17ba0` 2026-11-06 MOD-004: painel da fábrica exige chave de acesso (OS-FIC-002); `f823f56` 2026-11-06 fabrica: diagnóstico do pacote DIGITALGOV (contrato fictício FIC-COM-2026-001).
- **Responsável:** equipe técnica (Jerlian, Ruan, Arthur Miguel, Warley, Werverton, João Miguel, Warley C.); revisão individual deste módulo: sem registro.

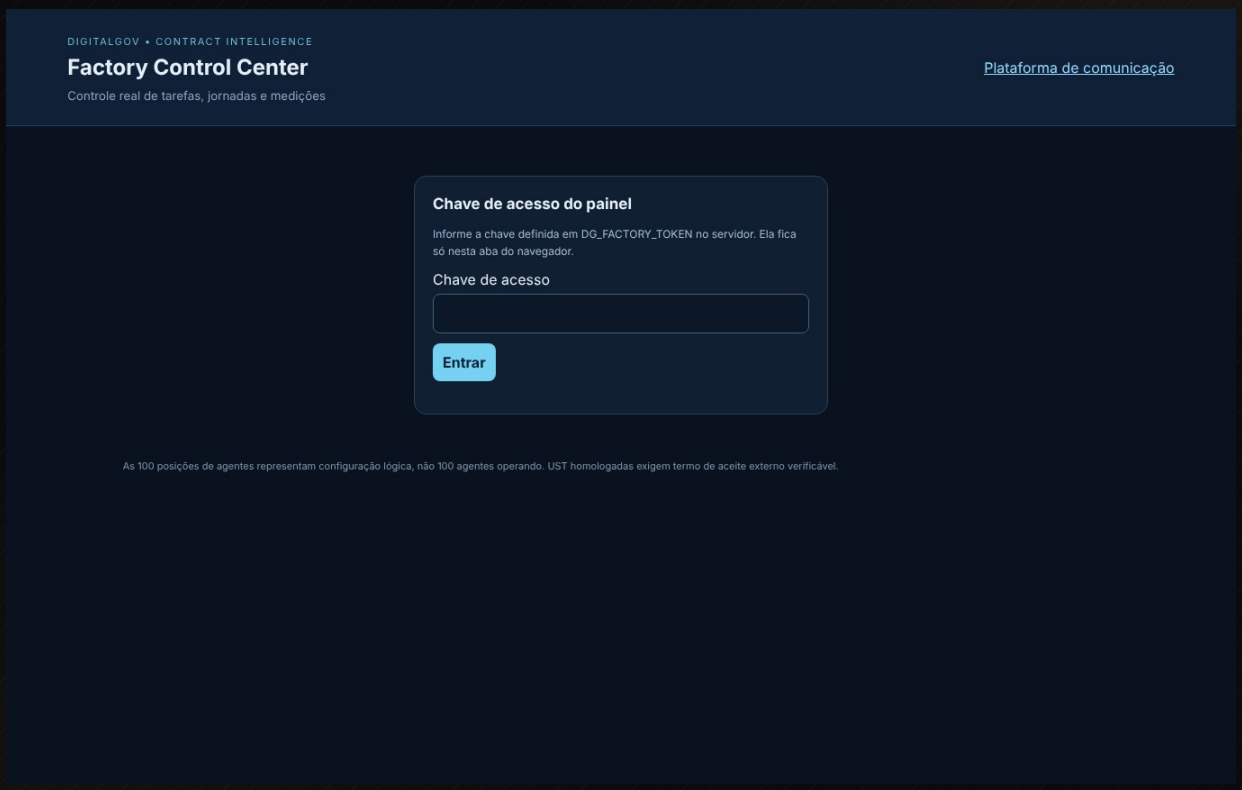

MOD-004 — 004_01_pede_chave (preview)

V4 FÁBRICA GOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

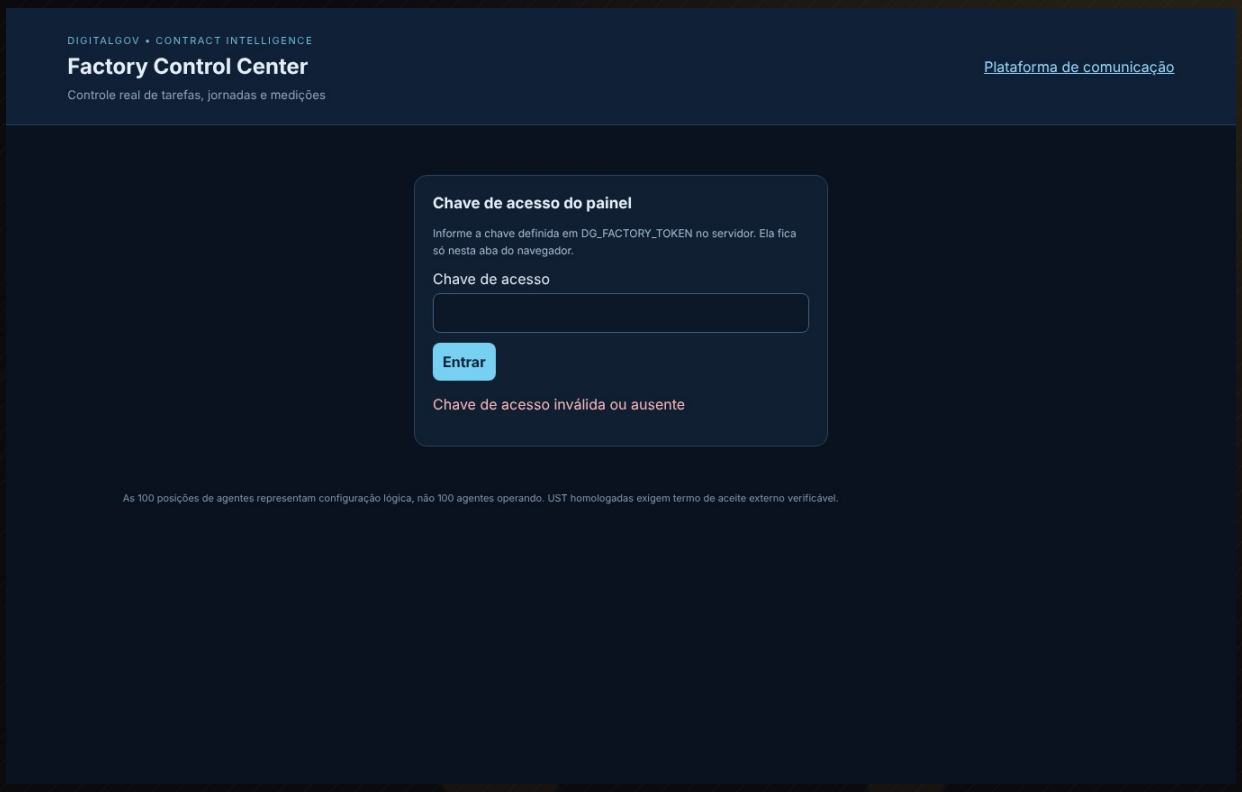

MOD-004 — 004_02_chave_errada (preview)

6. De onde vêm os números (memória de cálculo)

1. **O contrato define o catálogo de serviços** (`CATALOGO_SERVICOS.csv`): para cada serviço, quantas horas de cada perfil ele consome.
2. **A quantidade de cada módulo está definida na OS / tabela do contrato** (`TABELA_UST.csv`).
3. **A fórmula do contrato é `definida na OS`.**
4. **A OS diz quais serviços cada módulo usa.**
5. **O módulo só conta como executado** quando o código está no git, os testes passaram e a auditoria das evidências aprovou. Linhas de código não entram na conta.

Módulo	Serviço	Conta	UST	Valor
MOD-001	CAT-M01-02	previsto=202.5 UST (OS OS-FIC-002, item CAT-M01-02)	202,5	R$ 6.075,00
MOD-002	CORRETIVA-SEM-ITEM	previsto=0 UST (OS OS-FIC-002, item CORRETIVA-SEM-ITEM)	0	—

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

WHATSAPP (31) 99827-7323
E-MAIL fabricagovv@gmail.com
INSTAGRAM @Grupo_v4_fabricagovv
SEDE Alvorada de Minas · MG

Módulo	Serviço	Conta	UST	Valor
MOD-003	CORRETIVA-SEM-ITEM	previsto=0 UST (OS OS-FIC-002, item CORRETIVA-SEM-ITEM)	0	—
MOD-004	INTERNO-FABRICA	previsto=0 UST (OS OS-FIC-002, item INTERNO-FABRICA)	0	—

Exemplo de leitura: "4 h Analista × 1,2" significa 4 horas do perfil Analista, que valem 1,2 UST por hora = 4,8 UST.

8. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologias	Fonte
Backend (Python)	fastapi, uvicorn, python-docx	`contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio/FABRICA/requirements.txt`
Backend (Python)	fastapi, uvicorn, pydantic	`contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio/PLATAFORMA_COMUNICACAO/requirements.txt`
Infraestrutura (contêineres)	nginx:1.27-alpine	`contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio/docker-compose.yml`

9. Código de novembro de 2026

contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio: 6 commit(s), +5276 / −400 linhas.

Camada	Arquivos alterados	Linhas adicionadas	Linhas removidas
Outros	70	4187	371
Testes automatizados	11	481	6
Documentação	9	263	1
Infraestrutura (Docker, proxy, CI)	10	246	0
Banco de dados	10	99	22

Commit	Data	Descrição
`91613ad`	2026-11-06	MOD-003: implantação, backup, manuais e CI da plataforma de comunicação

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

WHATSAPP (31) 99827-7323
E-MAIL fabricagovv@gmail.com
INSTAGRAM @Grupo_v4_fabricagovv
SEDE Alvorada de Minas · MG

Commit	Data	Descrição
102fc9f	2026-11-06	MOD-003: código da plataforma de comunicação organizado por camada e módulo
c650bf4	2026-11-06	fabrica: OS-FIC-002 executada, auditada e medida (FIC-COM-2026-001)
de17ba0	2026-11-06	MOD-004: painel da fábrica exige chave de acesso (OS-FIC-002)
532d886	2026-11-06	MOD-001 MOD-002 MOD-003: sessão revogável, validações, privacidade e migrações (OS-FIC-002)
f823f56	2026-11-06	fabrica: diagnóstico do pacote DIGITALGOV (contrato fictício FIC-COM-2026-001)

Código de hoje (06/11/2026)

contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio: 6 commit(s), +5276 / −400 linhas.

Camada	Arquivos alterados	Linhas adicionadas	Linhas removidas
Outros	70	4187	371
Testes automatizados	11	481	6
Documentação	9	263	1
Infraestrutura (Docker, proxy, CI)	10	246	0
Banco de dados	10	99	22

10. Código total do sistema

contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio: 87 arquivo(s), 5045 linhas, 6 commit(s) desde o início.

Camada	Arquivos	Linhas
Outros	53	3985
Testes automatizados	9	475
Documentação	7	262
Infraestrutura (Docker, proxy, CI)	10	246
Banco de dados	8	77

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

WHATSAPP (31) 99827-7323
E-MAIL fabricagovv@gmail.com
INSTAGRAM @Grupo_v4_fabricagovv
SEDE Alvorada de Minas · MG

Linguagem	Arquivos	Linhas
Python	35	1701
JSON	4	1523
JavaScript	5	418
Outros	12	364
CSS	2	357
Markdown	7	262
Shell	3	94
YAML	3	92
HTML	2	78
Configuração	2	77
SQL	6	34
Docker	2	33
Texto	4	12

> *Linhas de código e commits mostram o tamanho do trabalho; a quantidade medida vem do catálogo do contrato, não das linhas.*

11. A fazer (planejado)

Nenhum módulo planejado além do que já foi executado.

12. Próximas etapas e pendências

- Próxima etapa normal: enviar ao órgão os 202,5 UST executados para conferência e termo de aceite.
- OS-FIC-002: a equipe técnica verifica o checklist — 18 controle(s) crítico(s) aguardam verificação humana — verifique e rode de novo com --aprovado-por "Nome (cargo)".
- Registrar a revisão de cada módulo por um membro da equipe (MOD-001, MOD-002, MOD-003, MOD-004) em PARTICIPACOES.csv (data, pessoa, módulo, tipo REVISAO/APROVACAO, evidência).

13. Arquivos de origem

- UST: `medicoes/<OS>.json` (medição pelo catálogo do contrato) e `contrato.yaml`.

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO V4

WHATSAPP (31) 99827-7323
E-MAIL fabricagovv@gmail.com
INSTAGRAM @Grupo_v4_fabricagovv
SEDE Alvorada de Minas · MG

- O que foi feito, código e commits: repositório git (`git log`, `git ls-files`).
- Testes: `evidencias/<OS>/<MÓDULO>/TESTES.json` (execuções reais com JUnit).
- Telas: capturas reais em `evidencias/<OS>/<MÓDULO>/SCREENSHOTS/`.
- A fazer e meta diária: `PLANEJAMENTO.csv` (estimativa pelo catálogo, datas de início e fim).
- Pagamentos: `PAGAMENTOS.csv` (data, competência, UST, valor e documento do pagamento).

Alvorada de Minas, 6 de novembro de 2026.

Atenciosamente,

Warley Luciano Costa Gomes
Administrador e Gerente Geral · DigitalGov

V4 FÁBRICA GOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL
